

# TRAVAUX SUR LA RN 21 DANS LA TRAVERSÉE D'AIXE-SUR-VIENNE

Réunion publique du 26 juin 2025

Intervenant : DIRCO / District de Limoges

---

# Sommaire

- 1. Présentation de la DIR Centre-Ouest**
- 2. Localisation et nature des travaux**
- 3. Modalités d'exploitation et phasage**
- 4. Mesures spécifiques en présence d'amiante**










# 1. Présentation de la DIR Centre-Ouest


## Notre réseau

- 1200 km de route
- 3 Régions
- 11 Départements

## Nos implantations

- 1 Siège
- 6 districts
- 21 CEI
- 500 agents

-  Siège de la DIR Centre-Ouest
-  Service Ingénierie routière
-  Antenne SIR
-  Centre d'Ingénierie et gestion du trafic
-  Centre d'entretien et d'Intervention (CEI)
-  Siège de service autoroutier
-  Siège de district et CEI

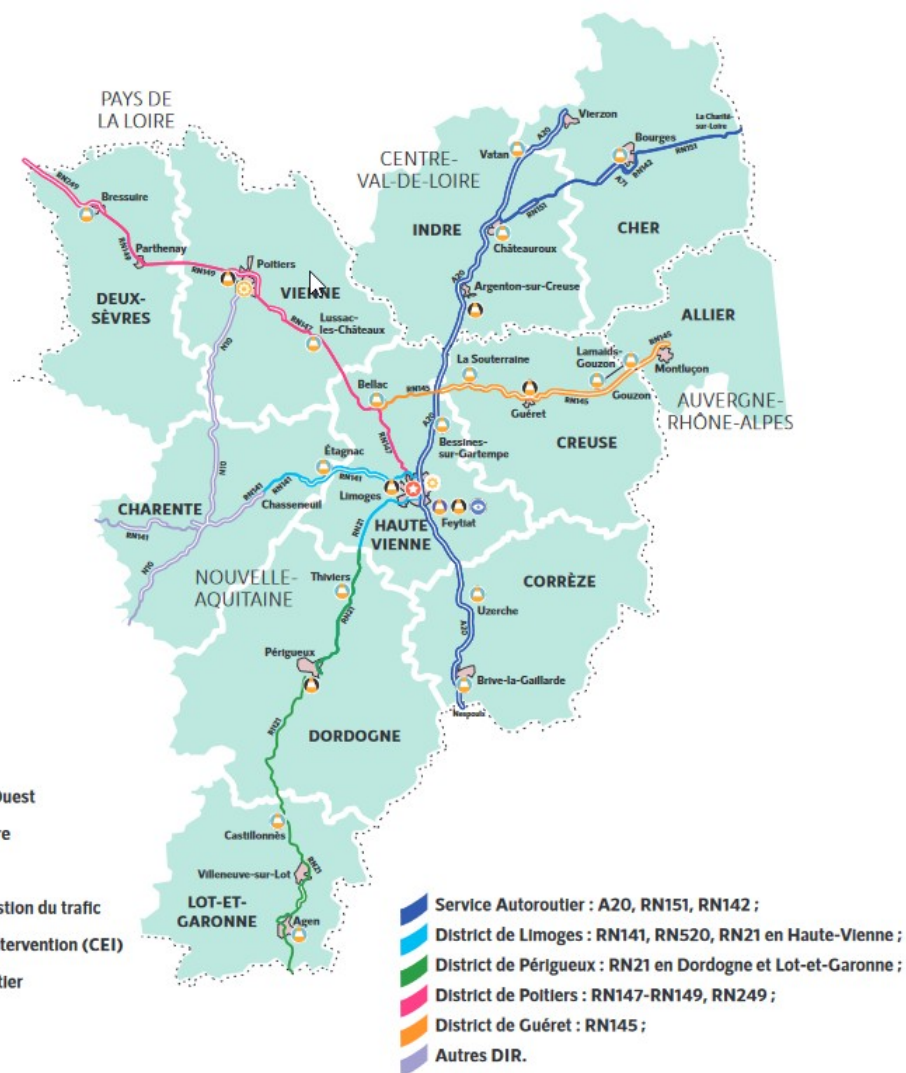


## Nos missions

- Gérer et exploiter le réseau routier national (autoroutes non concédées et RN)
  - Surveiller et intervenir sur les voies (en cas d'accident par exemple)
  - Gérer le trafic et informer les usagers
  - Entretien et moderniser le patrimoine routier : chaussées, glissières de sécurité, signalisation, ouvrages, aires de repos et de services, dépendances vertes, bassins de traitement des eaux
  - Améliorer la sécurité routière
  - Assurer des missions de maîtrise d'œuvre et de contrôle des travaux des projets routiers neufs
  - Diffuser l'information routière
-

## **2. Localisation et nature des travaux**




# 4 zones dégradées identifiées



## Contraintes

- Travaux en agglomération avec de nombreux riverains et commerces
  - Présence d'amiante (techniques et financières) - Chrysotile
  - Besoin d'autres gestionnaires de réaliser des travaux :
    - la SNCF (PN),
    - le syndicat des eaux « Vienne-Briance-Gorre »
    - La communauté de commune Val de Vienne
    - Orange
-

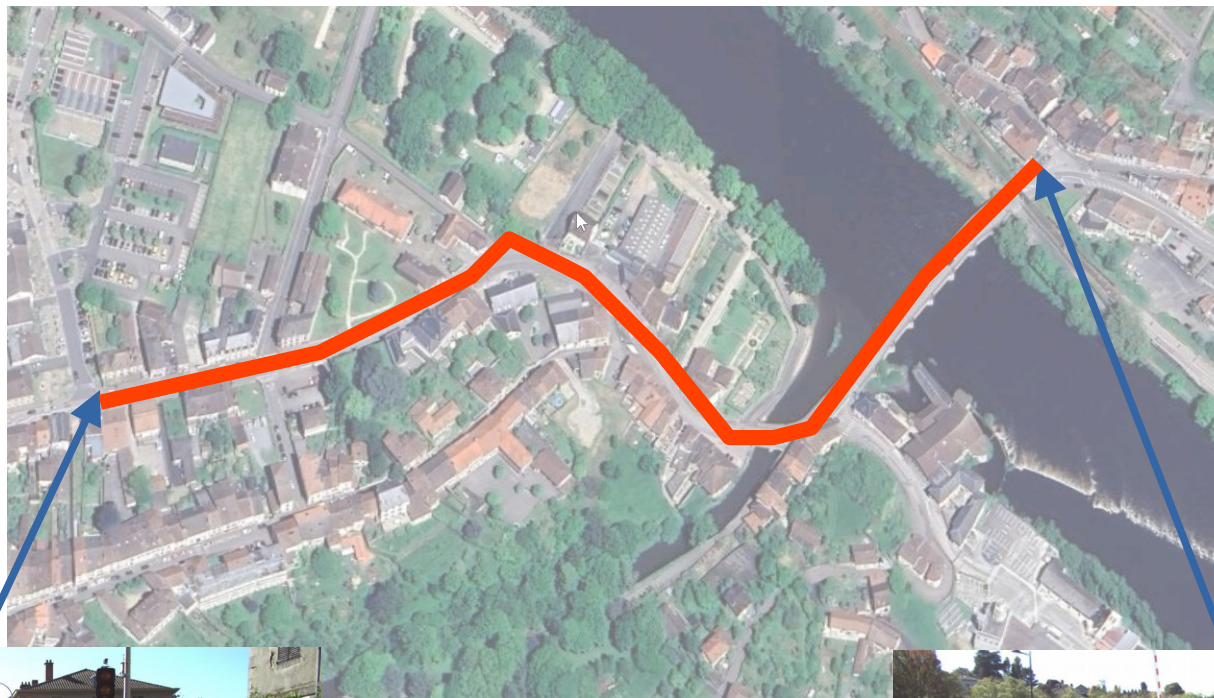

# 1ère tranche de travaux

PR13+530

PR12+930



PR 12 - 93131m


## Nature des travaux

- Réfection de la chaussée (fraisage et couche de roulement)
  - Réfection des gardes-corps des deux ouvrages
  - Changement du platelage du passage à niveaux
  - Forages sous chaussée par le SMAEP VBG
  - Reprise du réseau d'assainissement par la Communauté de commune Val de Vienne
-

# 3. Modalités d'exploitation et phasage

## **Phase 1 - Travaux de sécurisation du réseau AEP par forage sous chaussée**

- Emprise du chantier : Place des Hortails et Promenade des Grèves
  - Durée intervention 2 semaines : entre le 15 Juillet et le 25 Juillet 2025 sous alternat de circulation de la RN 21
  - Occupation de la place des Hortails pour les travaux avec création de deux places « d'arrêt minute » pour les commerces
  - Une Coupure AEP aura lieu sur une demi-journée – Date à définir en fonction de l'avancement des travaux
-

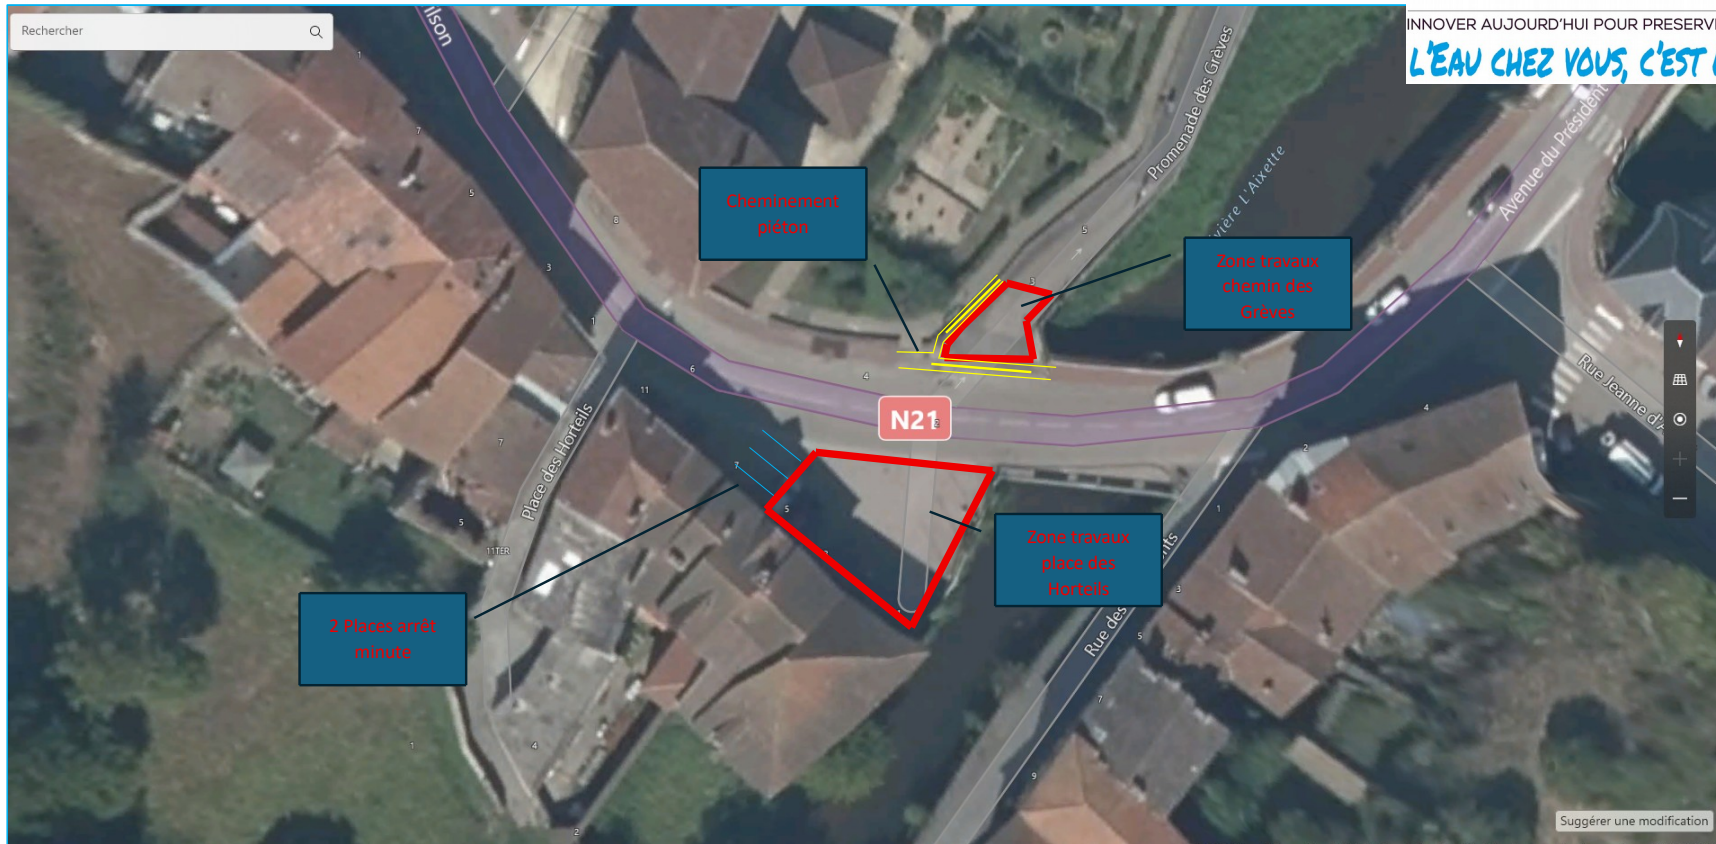


## **Phase 2 - Travaux réalisés sous fermeture de la N21 entre le 28 juillet et le 8 août 2025 avec maintien des accès des piétons aux commerces et habitations**

- Phase 2a - désamiantage
    - Installation de chantier et mise en place des mesures de protection dans le cadre de la procédure de désamiantage de la chaussée
    - Rabotage de la chaussée
    - Rabotage complémentaire des tranchées pour la communauté de communes Val de Vienne
  - Phase 2b
    - Travaux d'assainissement de la communauté de communes Val de Vienne
    - Travaux du passage à niveau de la SNCF (3 à 4 nuits)
  - Phase 2c
    - Mise en œuvre des enrobés
    - Réalisation du marquage au sol
-

# Déroulement des travaux


## SEMAINE 31 : du 28/07 au 01/08

- Fermeture RN 21 dès 08:00 par DIRCO
- Rabotages du 28 au 30/07 inclus (travaux en double poste 6h-22h)
- Travaux d'assainissement (entreprise PRADO (à partir du 30/07 → 04/08 environ))
- Travaux SNCF (travaux de nuits à compter du 29/07 soir)

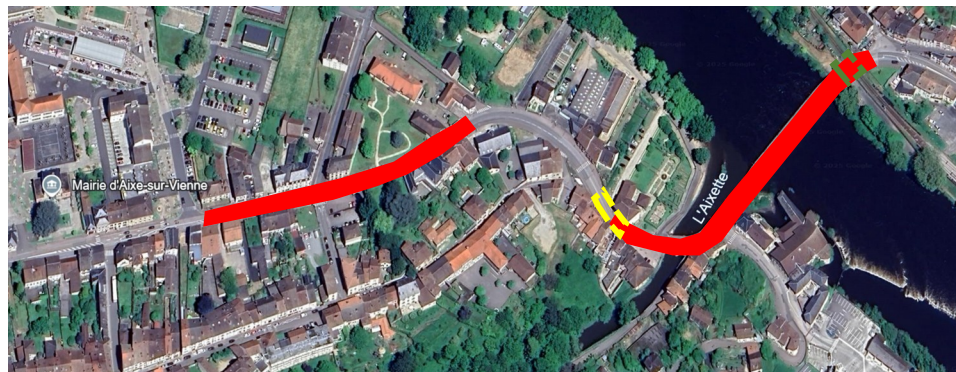

## SEMAINE 32 : du 04/08 au 08/08


- Fin des travaux d'assainissement (entreprise PRADO (→ 04/08))
- Mise en œuvre des enrobés du 05 au 07/08 avec le 08/08 matinée de secours.
- Marquage au sol vendredi 09/08 et remise en service RN21

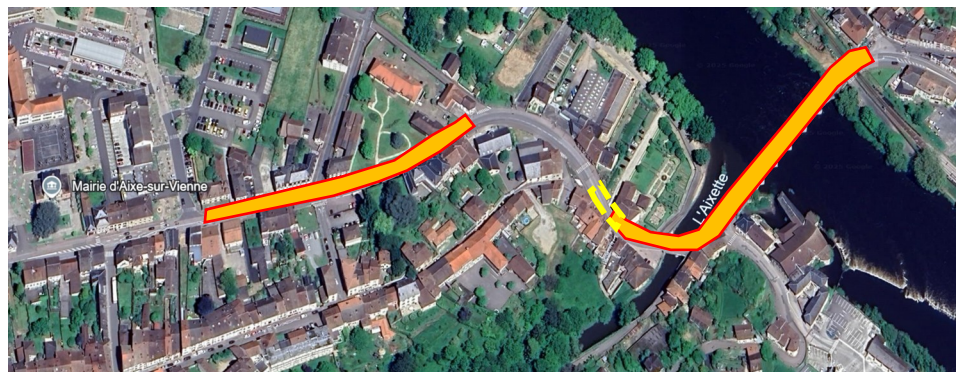


Hors aléas

## Travaux d'assainissement

- Des travaux de reprise du réseau d'eaux usées sont prévus à l'occasion des travaux de voirie :
    - Reprise du branchement de l'école du Sauveur et d'un bâtiment communal (cf plan)
    - Ces travaux consistent à la création d'un réseau d'environ 60 mètres et la reprise des deux branchements cités
    - les travaux auront lieu durant la période de fermeture de la route durant les semaines 31 et 32
-

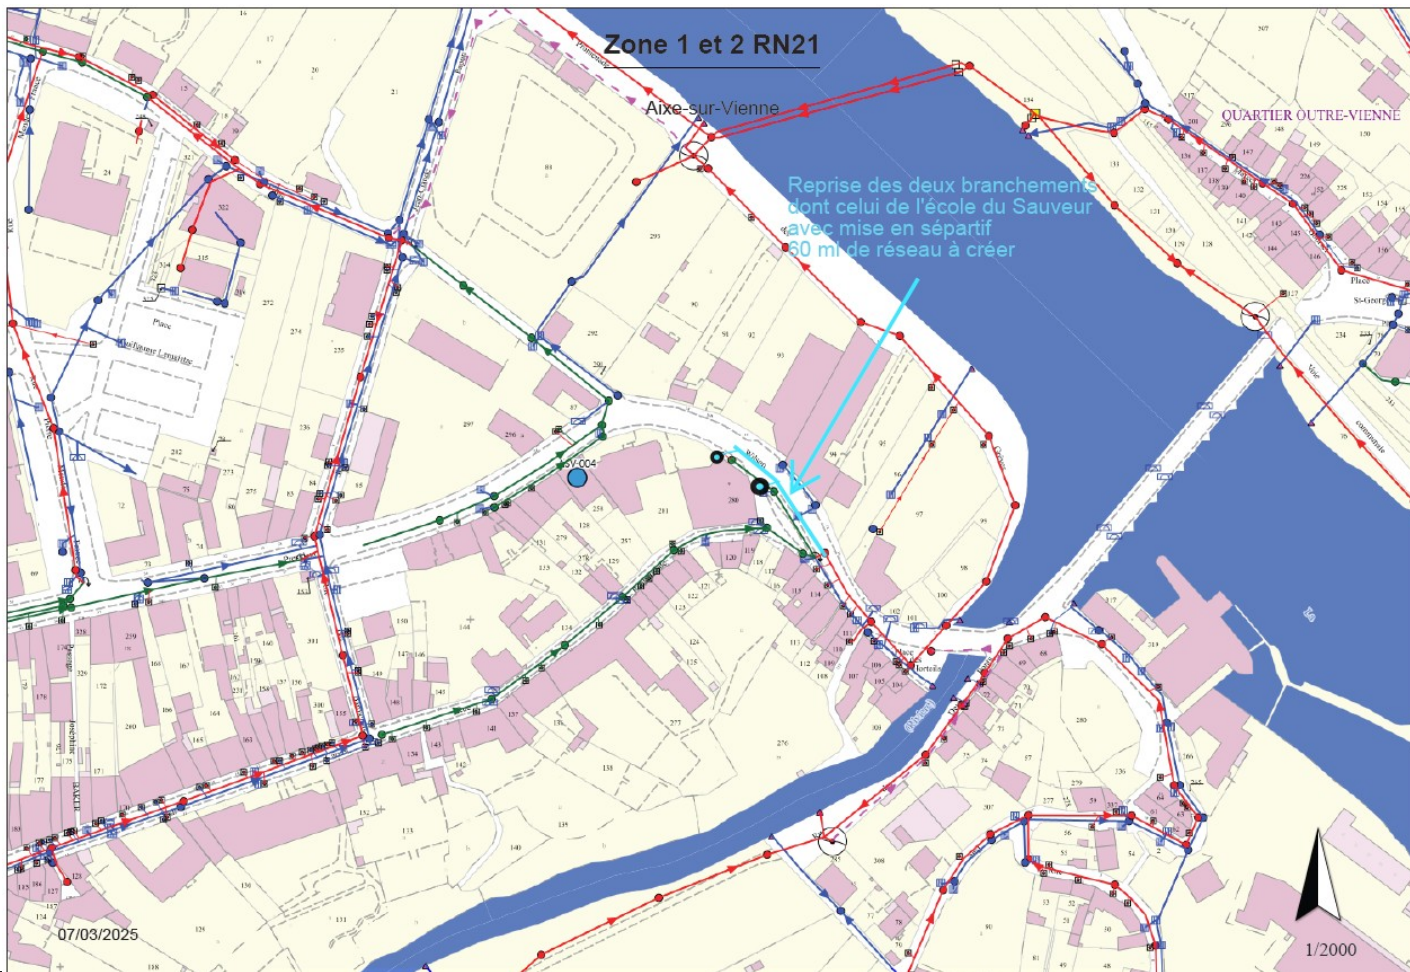

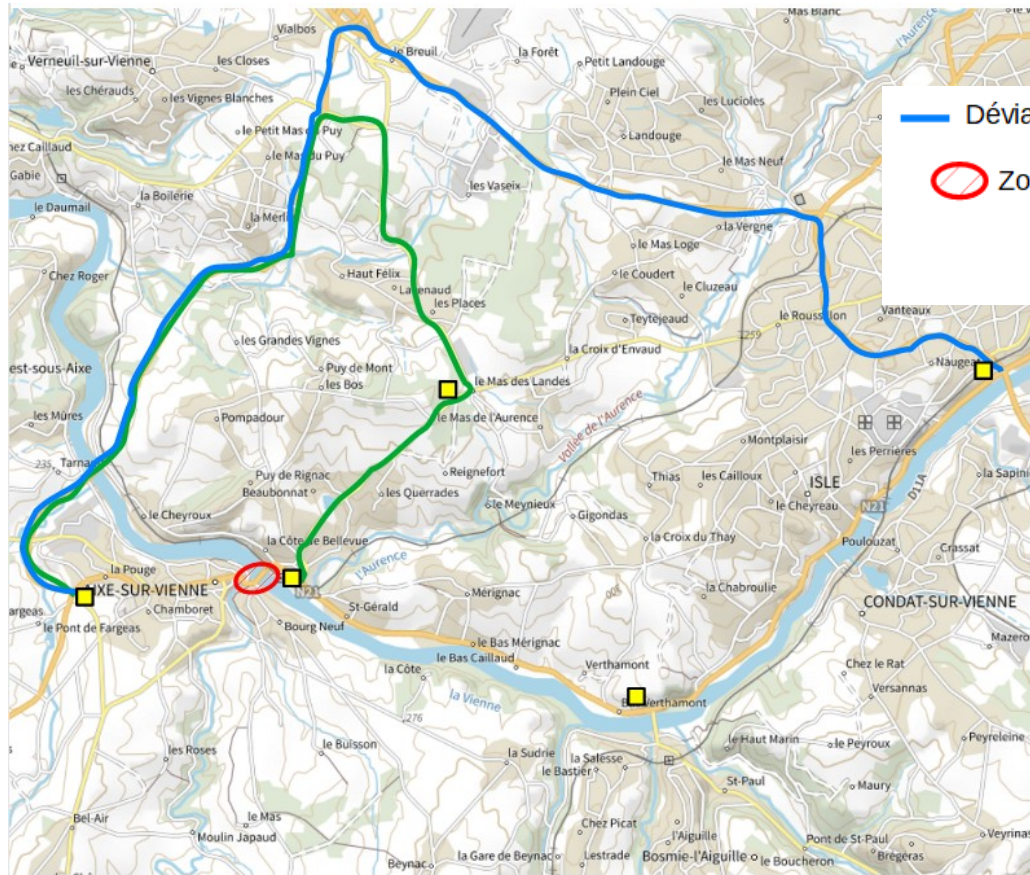


## Itinéraires de déviation

— Déviation VL + PL

○ Zone de travaux

— Déviation VL uniquement

■  
**ROUTE  
BARRÉE**  
À xx KM  
du yy/07  
au zz/08

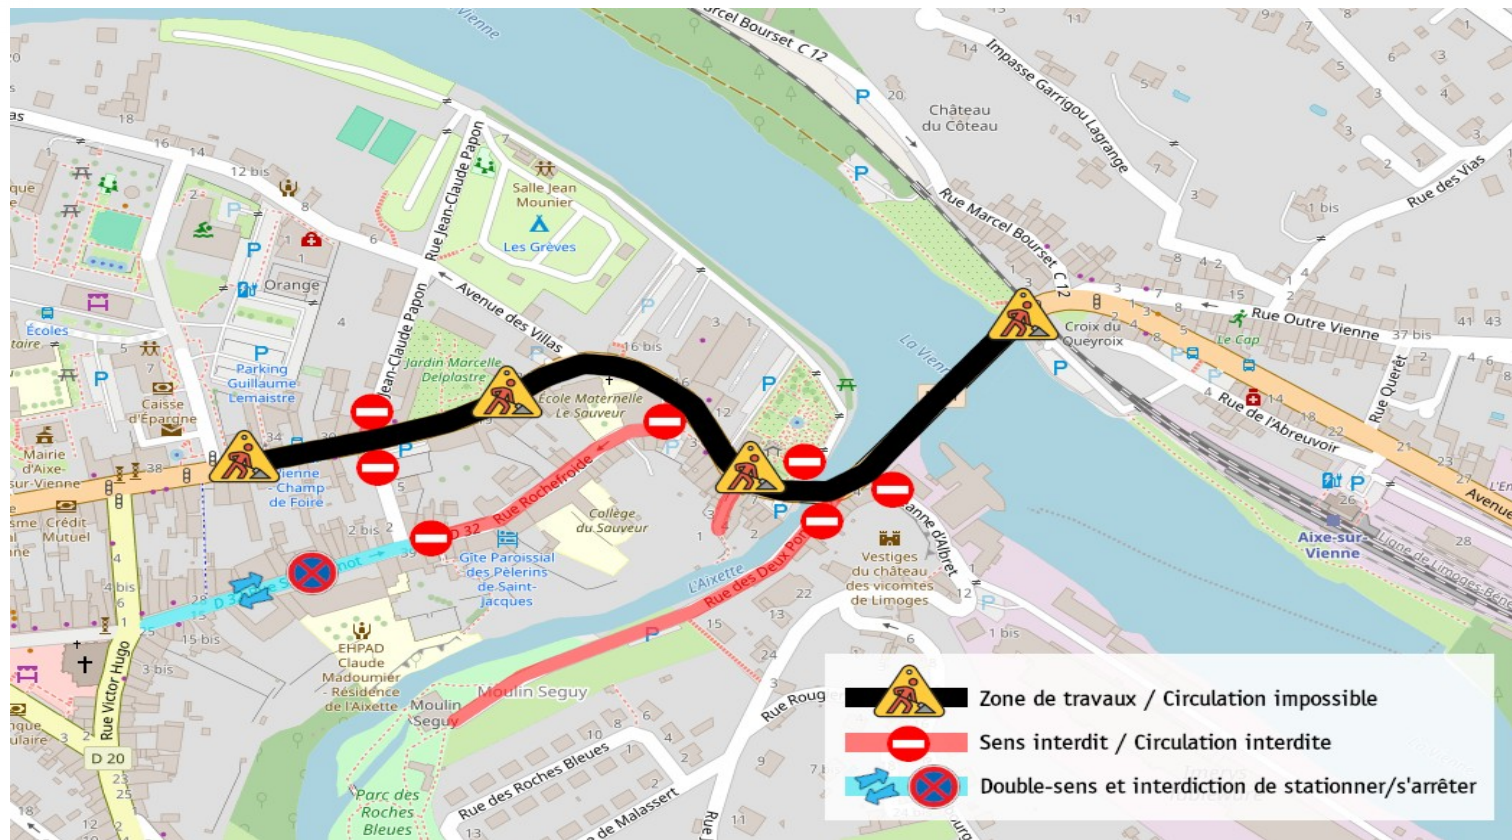

- Du lundi 28 juillet au vendredi 08 août :

L'accès et le débouché de la rue Jeanne d'Albret seront interdits

L'accès à la rue des Deux Ponts sera interdit

L'accès à la promenade des Grèves sera interdit

L'accès à la rue Rochefroide sera interdit


L'accès et le débouché de la rue Jean Claude Papon seront interdits

Le débouché de la rue des Barbichets sera interdit

La rue Sadi Carnot sera mise en double sens de circulation afin de maintenir un accès de sécurité pour la maison de retraite et le stationnement des véhicules y sera totalement interdit

---

## - Phase 3 - Travaux de réfection du garde corps des 2 ouvrages entre le 20 et le 31 octobre 2025 sous alternat de circulation

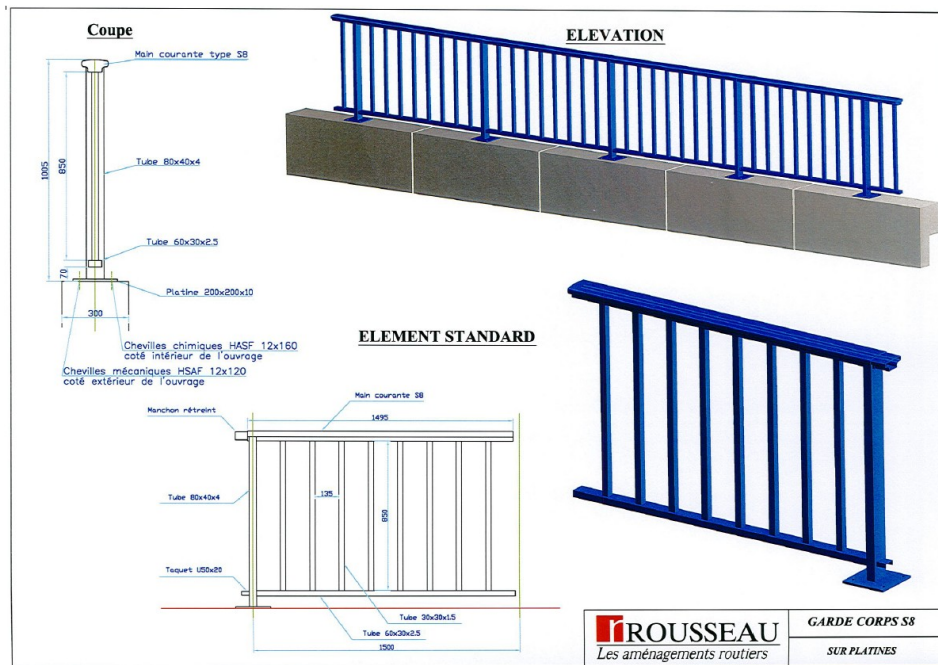

## **4. Mesures spécifiques en présence d'amiante**

## Préconisations en présence d'amiante

- Intervention d'une entreprise agréée (dossier soumis à inspection du travail par l'entreprise après notification du marché)
- Matériel utilisé : raboteuse avec arrosage en continu (pour éviter les dispersions de poussière) et aspiratrice (avec dispositif de stockage des poussières)



Rabotage sous brumisation de la chaussée par bandes. Le fraïsat tombe directement dans le conteneur bag placée dans la benne.

Conditionnement en conteneur bag 12 T à double enveloppe et à fermeture à Zip.



## Préconisations en présence d'amiante

- Zone de chantier isolée des riverains par barrière de type HERAS protégées avec des films étanches



- Mesures des concentrations en poussière en continu durant la phase chantier
-

## RETEX Entreprise

Groupe NGE : Bérengier Dépollution - Travaux en présence d'amiante (sous-section 3) intervention déjà pour la DIRCO sur la RN 141 (Etagnac) en 2016

Le rabotage mécanique à la raboteuse d'un enrobé amianté a donné un empoussièrement qui était :

**< 3,00 fibres par litre**

Ceci correspond à un **niveau 1 d'empoussièrement**. (Risque très faible - cf Code du travail)

---

## Mesures d'empoussièrement

Les mesures d'empoussièrement font l'objet d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme certifié.

ITGA

Parc Edonia

Rue de la Terre Adélie

35 768 Saint Grégoire

## Principe de mesurage

Avant les travaux de retrait

Pendant les travaux de retrait

À la fin des travaux

Référence

Sur opérateur

proximité chantier

Recalage

---



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

---
